Udførsels tidsplan for
Nyt Pædagogisk Servicecenter

ID	Opgavenavn	Duration	Start	Finish
1	Kontrolmiljøinnice	1 day	Ons 01-01-04	Ons 01-01-04
2	Udbudsmat. Afsendes	20 days	Fri 02-01-04	Tor 29-01-04
3	Forhåndsmøde	2 days	Fri 30-01-04	Man 02-02-04
4	Licitation	1 day	Tirs 03-02-04	Tirs 03-02-04
5	Indkaldelse fra Bygherre	10 days	Ons 04-02-04	Tirs 17-02-04
6	Kontrahering	10 days	Ons 18-02-04	Tirs 02-03-04
7	Byggeri opstart	1 day	Ons 03-03-04	Ons 03-03-04
8	Byggepladsindvinding	1 day	Tors 01-04-04	Tors 01-04-04
9	Fjernelse af asfalt	2 days	Fri 02-04-04	Man 05-04-04
10	Muldaframning	2 days	Tirs 06-04-04	Ons 07-04-04
11	Afsætning og opmåling	1 day	Tors 08-04-04	Tors 08-04-04
12	Udgravning til indvendigt punktfundament	1 day	Fri 09-04-04	Fri 09-04-04
13	Udgravning til udvendigt fundament	3 days	Man 12-04-04	Ons 14-04-04
14	Udgravning til kloak	1 day	Fri 09-04-04	Fri 09-04-04
15	Udgravning til Vand/Varme	1 day	Fri 09-04-04	Fri 09-04-04
16	Udgravning til El	1 day	Man 12-04-04	Man 12-04-04
17	Udvendig kloak	1 day	Man 12-04-04	Man 12-04-04
18	Installering af vand og varmerør til teknikrum	1 day	Man 12-04-04	Man 12-04-04
19	Installering af el kabler til teknikrum	1 day	Man 12-04-04	Man 12-04-04
20	Montage af udspændinger i fundament	1 day	Tirs 15-04-04	Tirs 15-04-04
21	Støbning af fundament	3 days	Fri 16-04-04	Tirs 20-04-04
22	Opmuring af letbetonblokke	3 days	Ons 21-04-04	Fri 23-04-04
23	Fugtisning sokkel	3 days	Man 26-04-04	Ons 28-04-04
24	Jord pålydtning	1 day	Tors 29-04-04	Tors 29-04-04
25	Indvendig kloak	1 day	Man 26-04-04	Man 26-04-04
26	Ventilationsrør i jord	3 days	Tors 29-04-04	Man 03-05-04
27	Kapillarbrydende lag	2 days	Tirs 04-05-04	Ons 05-05-04
28	Trækning af indvendige vand/varme rør	2 days	Tors 06-05-04	Fri 07-05-04
29	Trækning af el rør	2 days	Tors 06-05-04	Fri 07-05-04
30	Udlægning af isolering i terrændæk	1 day	Man 10-05-04	Man 10-05-04
31	Montage af radon sperre	1 day	Tirs 11-05-04	Tirs 11-05-04
32	Udlægning af armeringsnet	2 days	Ons 12-05-04	Tors 13-05-04
33	Udlægning af gulvvarmeslanger	2 days	Fri 14-05-04	Man 17-05-04
34	Støbning af betongulv	3 days	Tirs 18-05-04	Tors 20-05-04
35	Opstilling af stålsøjler og limtræsrem	4 days	Fri 21-05-04	Ons 26-05-04
36	Tilstøbning af stålsøjler	2 days	Fri 21-05-04	Man 24-05-04
37	Opmuring bagmur	10 days	Tirs 25-05-04	Man 07-06-04
38	Opstilling beton søjler/bjælker (hems)	4 days	Fri 21-05-04	Ons 26-05-04
39	Forstalling/armering til betonplade (hems)	5 days	Tors 27-05-04	Ons 02-06-04
40	Støbning af betonplade (hems)	1 day	Tors 03-06-04	Tors 03-06-04
41	Tørretid for betonpladen	5 days	Fri 04-06-04	Tors 10-06-04
42	Afforskalling	1 day	Fri 11-06-04	Fri 11-06-04
43	Varme rør til radiatorer (vi gør rum)	1 day	Man 14-06-04	Man 14-06-04
44	Dæk ved vi gør rum	2 days	Man 14-06-04	Tirs 15-06-04
45	Ung-profil ved hems	2 days	Tirs 06-07-04	Ons 07-07-04
46	Indervægge ved vi gør rum	3 days	Tors 08-07-04	Man 12-07-04
47	Indvendig stålrappe	1 day	Tirs 13-07-04	Tirs 13-07-04
48	Rækværk hems	10 days	Ons 14-07-04	Tirs 27-07-04
49	Elkabler på bagmur	2 days	Tors 27-05-04	Fri 28-05-04
50	Varmerør til hems	1 day	Tors 27-05-04	Tors 27-05-04
51	Støbning af betonbjælke ved hjørne	3 days	Tors 27-05-04	Man 31-05-04
52	Opmuring af formur	15 days	Tirs 01-06-04	Man 21-06-04
53	Lydydervægge	10 days	Tirs 22-06-04	Man 05-07-04
54	Nedhæning af glaspartier ved eksist.gang	2 days	Tirs 22-06-04	Ons 23-06-04
55	Opmuring af indervægge	4 days	Tors 24-06-04	Tirs 29-06-04
56	Opslagning feb 220 bjælke ved eksis.gang	1 day	Ons 30-06-04	Ons 30-06-04
57	Trae søjler/rem (hems)	2 days	Man 14-06-04	Tirs 15-06-04
58	Rejsning af spær (hovedbygning)	4 days	Ons 16-06-04	Man 21-06-04
59	Underlag og eltilandslister	2 days	Tirs 22-06-04	Ons 23-06-04
60	Montage af lægter	2 days	Tors 24-06-04	Fri 25-06-04
61	Lægning af skifer og grat	5 days	Man 28-06-04	Fri 02-07-04
62	Udvendig underbeklædning og stern	4 days	Man 05-07-04	Tors 08-07-04
63	Tagrende (hovedbygning)	2 days	Fri 09-07-04	Man 12-07-04
64	Montage af ovenlys parti	1 day	Fri 09-07-04	Fri 09-07-04
65	Isolering og indvendig loftbeklædning(hovedbygning)	5 days	Man 12-07-04	Fri 16-07-04
66	Fjernelse af tagdækning over eksis.gang	2 days	Man 19-07-04	Tirs 20-07-04
67	Rem (mellem bygning)	1 day	Wed 21-07-04	Wed 21-07-04
68	Montage af spær (mellem bygning)	3 days	Tors 22-07-04	Man 26-07-04
69	Kler over eksist.gang	1 day	Tirs 27-07-04	Tirs 27-07-04
70	Vandfast krydsfiner	2 days	Wed 28-07-04	Thu 29-07-04
71	2 gange tagpap	3 days	Fri 30-07-04	Tirs 03-08-04
72	Udvendig stern (mellem Bygning)	1 day	Wed 04-08-04	Wed 04-08-04
73	Tagrender	1 day	Thu 05-08-04	Thu 05-08-04
74	Isolering og indvendig loftbeklædning(mellem bygning	5 days	Tirs 27-07-04	Man 02-08-04
75	Vandskuring for/bag og indervægge	10 days	Thu 01-07-04	Wed 14-07-04
76	Fliserarbejde wc	2 days	Thu 15-07-04	Fri 16-07-04
77	Syntige ventilationrer	5 days	Thu 15-07-04	Wed 21-07-04
78	Isætning af vinduer/døre	15 days	Thu 15-07-04	Wed 04-08-04
79	System loft	3 days	Thu 15-07-04	Mon 19-07-04
80	Malerarbejde	10 days	Thu 15-07-04	Wed 28-07-04
81	Gulvbelægning Linoleum	3 days	Thu 15-07-04	Mon 19-07-04
82	Trægulv hems	2 days	Thu 15-07-04	Fri 16-07-04
83	Montage af vvs	1 day	Mon 19-07-04	Mon 19-07-04
84	Udvendig stålrappe	1 day	Thu 15-07-04	Thu 15-07-04
85	Udvendig belægning	5 days	Fri 16-07-04	Thu 22-07-04
86	Aflevering	1 day	Fri 06-08-04	Fri 06-08-04

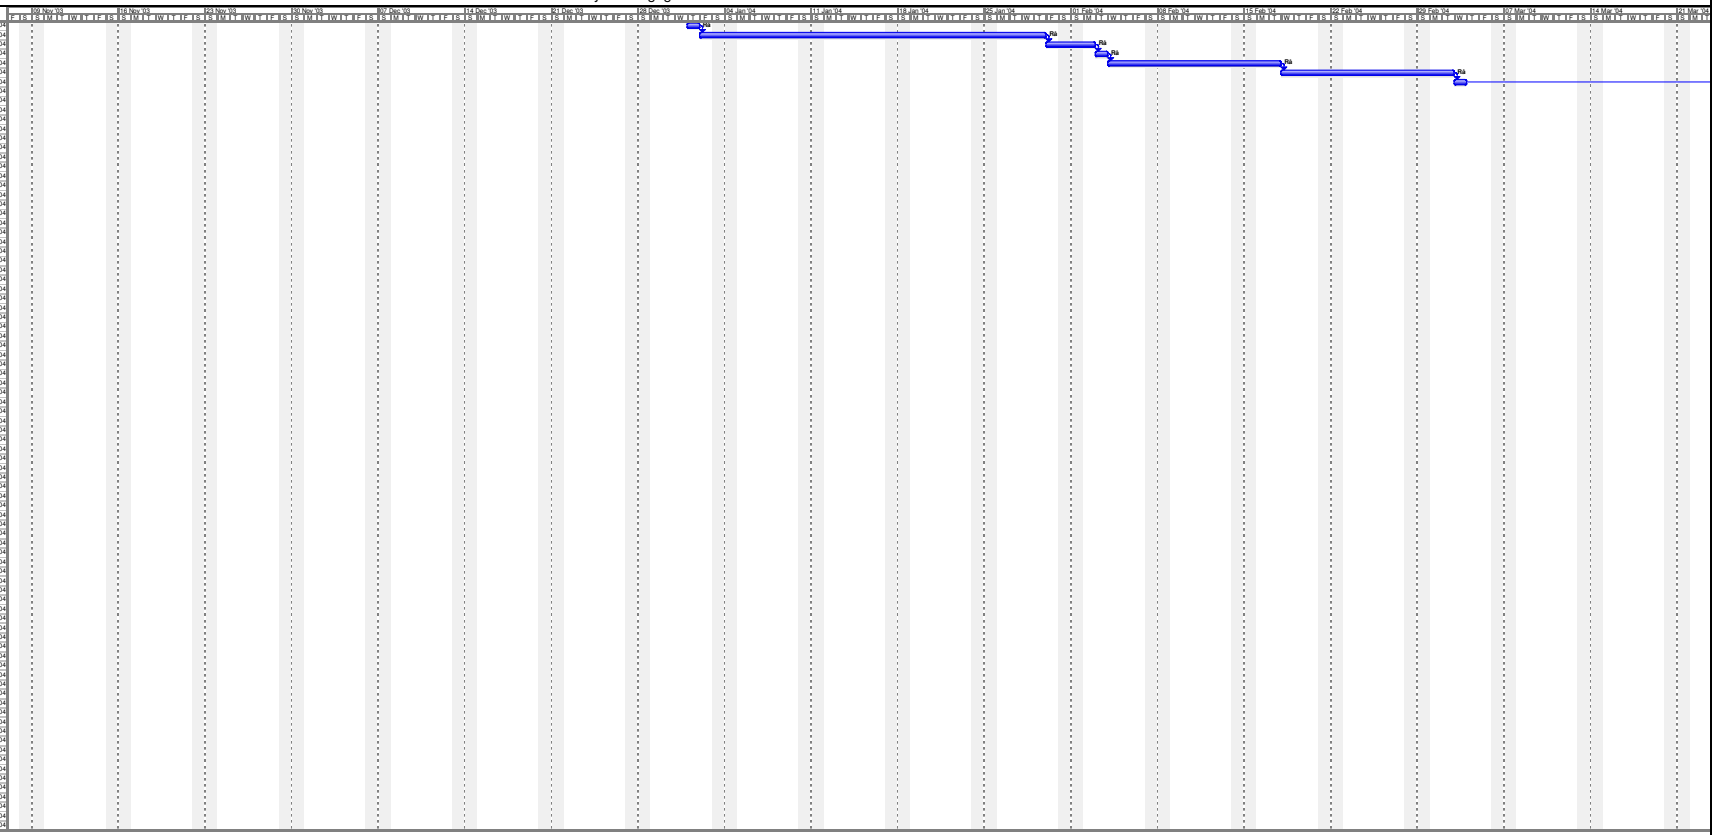

Projekt: Udførsels tidsplan
Dato: Fri 23-03-12

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline

Udførsels tidsplan for
Nyt Pædagogisk Servicecenter

ID	Opgavenavn	Duration	Start	Finish
1	Lokalomlaemnince	1 day	Ifto 01-01-04	Ifto 01-01-04
2	Udbudsmat. Afsendes	20 days	Fri 02-01-04	Thu 29-01-04
3	Forhändsmede	2 days	Fri 30-01-04	Mon 02-02-04
4	Licitation	1 day	Tue 03-02-04	Tue 03-02-04
5	Indkaldelse fra Bygherre	10 days	Wed 04-02-04	Tue 17-02-04
6	Kontrahering	10 days	Wed 18-02-04	Tue 02-03-04
7	Byggeri opstart	1 day	Wed 03-03-04	Wed 03-03-04
8	Bygepladsindvirning	1 day	Thu 01-04-04	Thu 01-04-04
9	Fjernelse af asfalt	2 days	Fri 02-04-04	Mon 05-04-04
10	Muldaframning	2 days	Tue 06-04-04	Wed 07-04-04
11	Afsætning og opmåling	1 day	Thu 08-04-04	Thu 08-04-04
12	Udgravning til indvendigt punktfundamemt	1 day	Fri 09-04-04	Fri 09-04-04
13	Udgravning til udvendigt fundament	3 days	Mon 12-04-04	Wed 14-04-04
14	Udgravning til kloak	1 day	Fri 09-04-04	Fri 09-04-04
15	Udgravning til Vand/Varme	1 day	Fri 09-04-04	Fri 09-04-04
16	Udgravning til El	1 day	Mon 12-04-04	Mon 12-04-04
17	Udvendig kloak	1 day	Mon 12-04-04	Mon 12-04-04
18	Installering af vand og varmerør til teknikrum	1 day	Mon 12-04-04	Mon 12-04-04
19	Installering af el kabler til teknikrum	1 day	Mon 12-04-04	Mon 12-04-04
20	Montage af udspænvinger i fundament	1 day	Thu 15-04-04	Thu 15-04-04
21	Støbning af fundament	3 days	Fri 16-04-04	Tue 20-04-04
22	Opmuring af letbetonblokke	3 days	Wed 21-04-04	Fri 23-04-04
23	Pudsning sokkel	3 days	Mon 26-04-04	Wed 28-04-04
24	Jord pålydtning	1 day	Thu 29-04-04	Thu 29-04-04
25	Indvendig kloak	1 day	Mon 26-04-04	Mon 26-04-04
26	Ventilationsrør i jord	3 days	Thu 29-04-04	Mon 03-05-04
27	Kapillarbrydende lag	2 days	Tue 04-05-04	Wed 05-05-04
28	Trækning af indvendige vand/varme rør	2 days	Thu 06-05-04	Fri 07-05-04
29	Trækning af ekser	2 days	Thu 06-05-04	Fri 07-05-04
30	Udlægning af isolering i terrændæk	1 day	Mon 10-05-04	Mon 10-05-04
31	Montage af radon sperre	1 day	Tue 11-05-04	Tue 11-05-04
32	Udlægning af armeringsnet	2 days	Wed 12-05-04	Thu 13-05-04
33	Udlægning af gulvvarmeslanger	2 days	Fri 14-05-04	Mon 17-05-04
34	Støbning af betongulv	3 days	Tue 18-05-04	Thu 20-05-04
35	Opstilling af stålsøjler og limtræsrem	4 days	Fri 21-05-04	Wed 26-05-04
36	Tilstøbning af stålsøjler	2 days	Fri 21-05-04	Mon 24-05-04
37	Opmuring bagmur	10 days	Tue 25-05-04	Mon 07-06-04
38	Opstilling beton søjler/bjælker (hems)	4 days	Fri 21-05-04	Wed 26-05-04
39	Forstalling/armering til betonplade (hems)	5 days	Thu 27-05-04	Wed 02-06-04
40	Støbning af betonplade (hems)	1 day	Thu 03-06-04	Thu 03-06-04
41	Tømsild for betonpladen	5 days	Fri 04-06-04	Thu 10-06-04
42	Afforskalling	1 day	Fri 11-06-04	Fri 11-06-04
43	Varme rør til radiatorer (vi gør rum)	1 day	Mon 14-06-04	Mon 14-06-04
44	Dæk ved vi gør rum	2 days	Mon 14-06-04	Tue 15-06-04
45	Unp-profil ved hems	2 days	Tue 06-07-04	Wed 07-07-04
46	Indervægge ved vi gør rum	3 days	Thu 08-07-04	Mon 12-07-04
47	indvendig stålrappe	1 day	Tue 13-07-04	Tue 13-07-04
48	Rækværk hems	10 days	Wed 14-07-04	Tue 27-07-04
49	Elkabler på bagmur	2 days	Thu 27-05-04	Fri 28-05-04
50	Varmerør til hems	1 day	Thu 27-05-04	Thu 27-05-04
51	Støbning af betonbjælke ved hjørne	3 days	Thu 27-05-04	Mon 31-05-04
52	Opmuring af formur	15 days	Tue 01-06-04	Mon 21-06-04
53	Letydervægge	10 days	Tue 22-06-04	Mon 05-07-04
54	Nedrivning af glaspartier ved eksist.gang	2 days	Tue 22-06-04	Wed 23-06-04
55	Opmuring af indervægge	4 days	Thu 24-06-04	Tue 29-06-04
56	Opslagning feb 220 bjælke ved eksis.gang	1 day	Wed 30-06-04	Wed 30-06-04
57	Trae søjler/rem (hems)	2 days	Mon 14-06-04	Tue 15-06-04
58	Rejsning af spær (hovedbygning)	4 days	Wed 16-06-04	Mon 21-06-04
59	Underlag og ølstandsliister	2 days	Tue 22-06-04	Wed 23-06-04
60	Montage af lægter	2 days	Thu 24-06-04	Fri 25-06-04
61	Lægning af skifer og grat	5 days	Mon 28-06-04	Fri 02-07-04
62	Udvendig underbeklædning og stern	4 days	Mon 05-07-04	Thu 08-07-04
63	Tagrende (hovedbygning)	2 days	Fri 09-07-04	Mon 12-07-04
64	Montage af ovenlys parti	1 day	Fri 09-07-04	Fri 09-07-04
65	Isolering og indvendig loftbeklædning(hovedbygning)	5 days	Mon 12-07-04	Fri 16-07-04
66	Fjernelse af tagdækning over eksis.gang	2 days	Mon 19-07-04	Tue 20-07-04
67	Rem (mellem bygning)	1 day	Wed 21-07-04	Wed 21-07-04
68	Montage af spær (mellem bygning)	3 days	Thu 22-07-04	Mon 26-07-04
69	Kler over eksist.gang	1 day	Tue 27-07-04	Tue 27-07-04
70	Vandfast krydsfiner	2 days	Wed 28-07-04	Thu 29-07-04
71	2 gange tagtæp	3 days	Fri 30-07-04	Tue 03-08-04
72	Udvendig stern (mellem Bygning)	1 day	Wed 04-08-04	Wed 04-08-04
73	Tagrender	1 day	Thu 05-08-04	Thu 05-08-04
74	isolering og indvendig loftbeklædning(mellem bygning	5 days	Tue 27-07-04	Mon 02-08-04
75	Vandskuring for/bag og indervægge	10 days	Thu 01-07-04	Wed 14-07-04
76	Flisearbejde wc	2 days	Thu 15-07-04	Fri 16-07-04
77	Syntige ventilationrer	5 days	Thu 15-07-04	Wed 21-07-04
78	Isætning af vinduer/døre	15 days	Thu 15-07-04	Wed 04-08-04
79	System loft	3 days	Thu 15-07-04	Mon 19-07-04
80	Malerarbejde	10 days	Thu 15-07-04	Wed 28-07-04
81	Gulvbelægning Linoleum	3 days	Thu 15-07-04	Mon 19-07-04
82	Traegulv hems	2 days	Thu 15-07-04	Fri 16-07-04
83	montage af vvs	1 day	Mon 19-07-04	Mon 19-07-04
84	udvendig stålrappe	1 day	Thu 15-07-04	Thu 15-07-04
85	Udvendig belægning	5 days	Fri 16-07-04	Thu 22-07-04
86	Aflevering	1 day	Fri 06-08-04	Fri 06-08-04

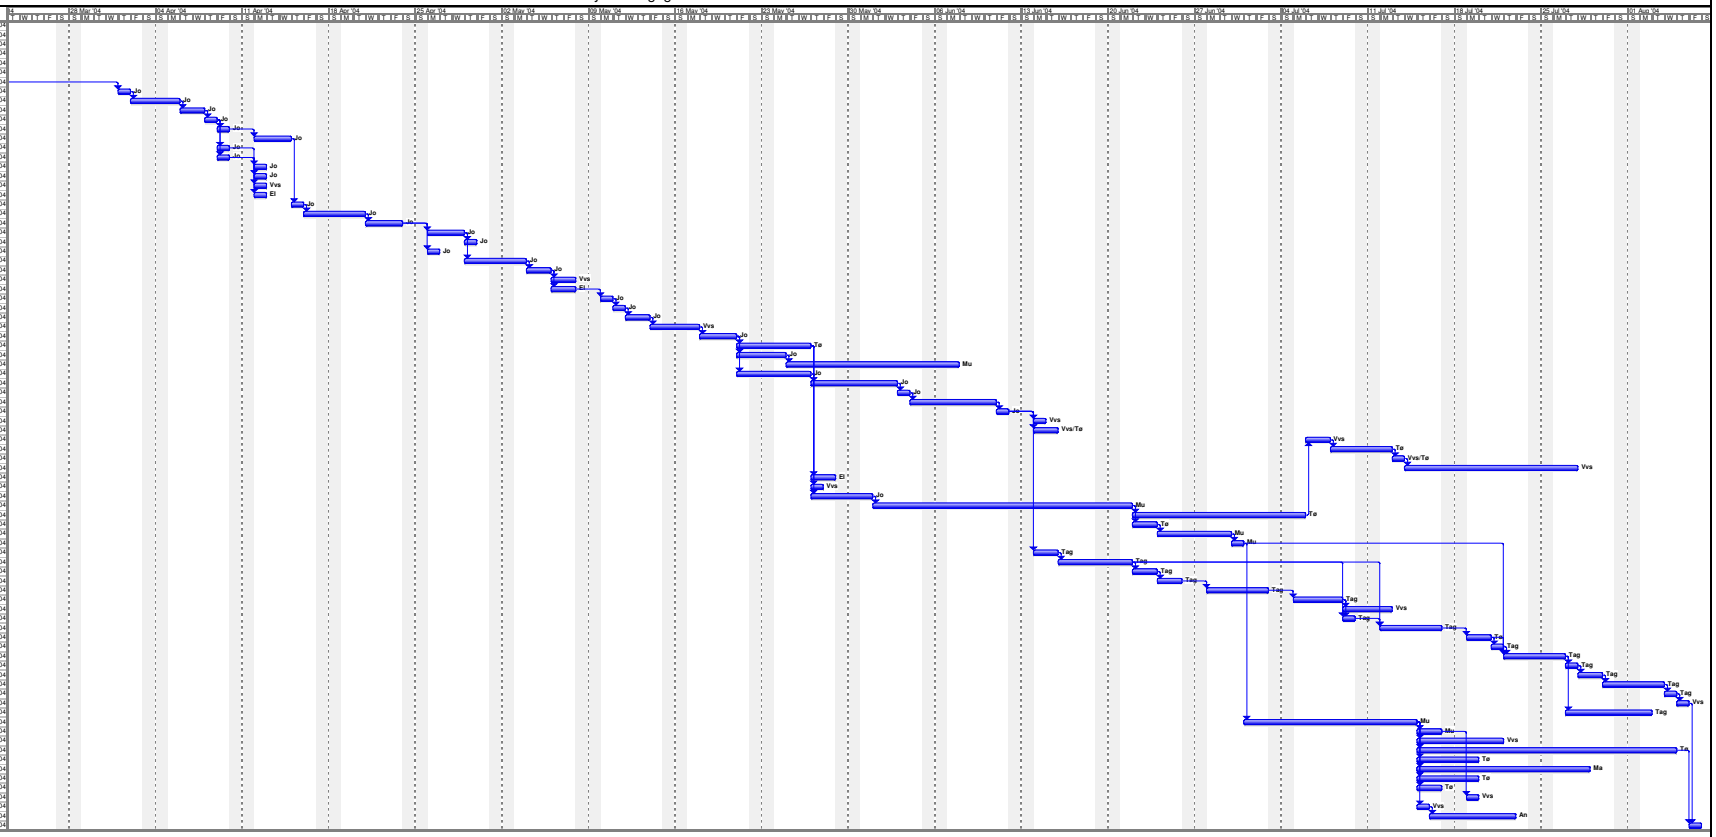

Projekt: Udførsels tidsplan
Dato: Fri 23-03-12

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
